



Styregruppen DIGTE (DIGitale sundhedsløsninger og TElemedicin

Præsentation på
Sundhedsstyregruppens møde den 20. november

Ved formandskabet Lone Becker Kjærgaard og
Anders Kjærulff



Opgaver for Styregruppen DIGTE

- Governance - sammenhæng og strategisk retning på tværs
- Samarbejde med klyngerne - fra lokale projekter til skalering og spredning
- Styregruppens portefølje - hvordan kan DIGTE bruges

Checklist





Eskalering


Rapportering

Driftsniveau

Nationalt niveau

Nationalt niveau

Nationalt niveau

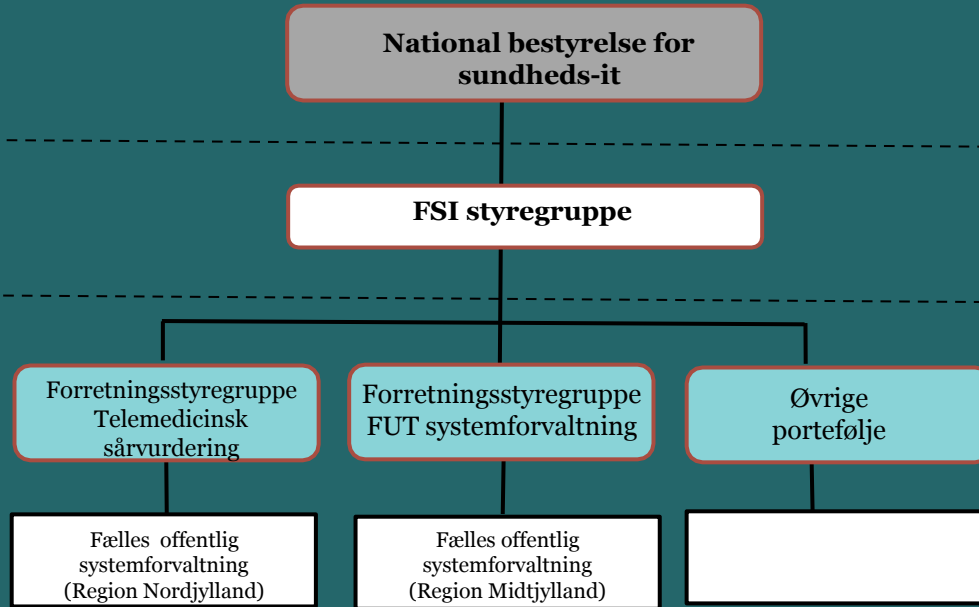

Organisering nationalt - Projekt

Eskalering


Rapportering

Driftsniveau

Nationalt niveau

Nationalt niveau

Landsdel niveau

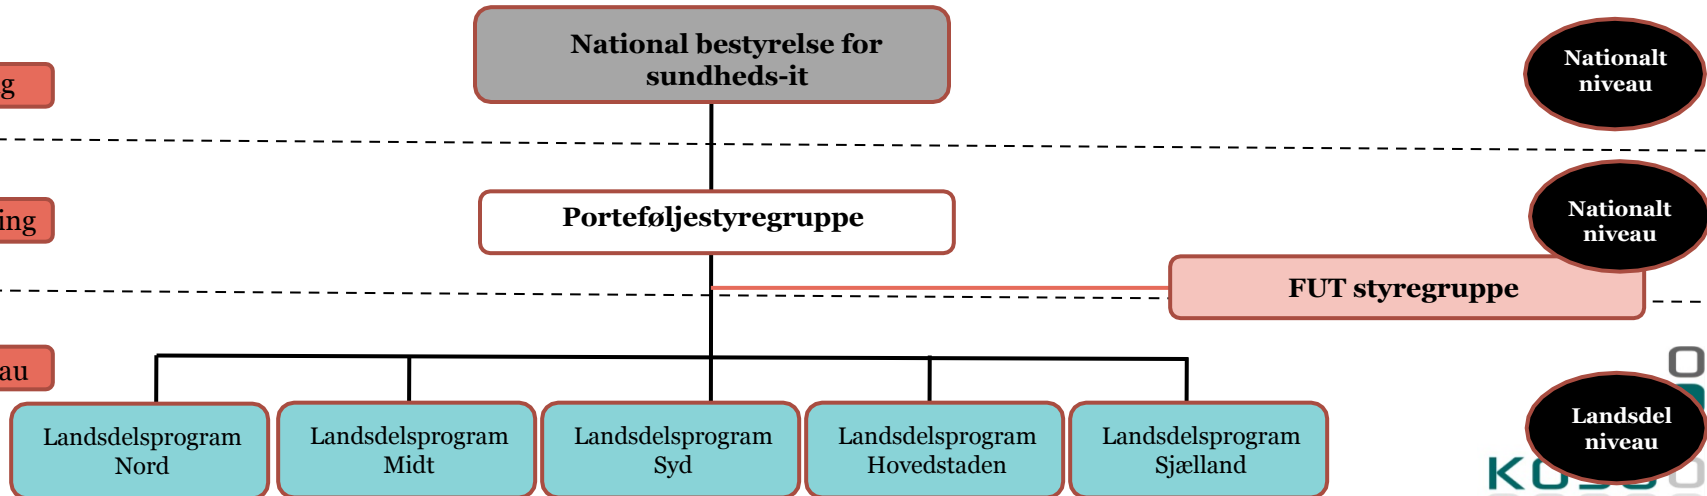



Nationalt
niveau

Midtjylland

Midtjylland

Midtjylland

Eskalering

Forberedelse,
udvikling
frem mod
drift og
opfølgning

Sundhedsstyregruppen

**Programstyregruppen for TeleKOL
(igangværende styregruppe)**

**Styregruppen DIGTE (DIGitale
sundhedsløsninger og Telemedicin)**

Kommende styregruppe
TeleSår (projekt)

Kommende styregruppe
TeleHjerter (projekt)

**Brugergruppe:
TeleSår**

**Brugergruppe:
TeleHjerter**

**Brugergruppe –
patient/borger-
perspektiv**



Governance - sammenhæng og strategisk retning på tværs


Etablering af en overordnet styringsmodel, som skal styrke og udvikle det tværsektorielle samarbejde inden for telemedicin og digitaliseringsområdet og dermed understøtte både bærende principper i sundhedsaftalen og konkrete handlinger som skal udmønte aftalen

Sikre sammenhæng mellem det nationale niveau, landsdelen og lokalt niveau. Et gælder de drifts- og udviklingsmæssige beslutninger, der skal træffes både lokalt (hospital/kommune), fælles i Midtjylland og nationalt.

Afklaring og prioritering vedr. driftsløsninger (eksempelvis prioritering af ønsker til nationale løsninger)

Handlerummet defineres af Sundhedsstyregruppen - og de nationale forpligtigelser i Økonomiaftalerne

Dialog- og udviklingsnotat til Sundhedsstyregruppen om strategisk retningen og perspektiver for området.

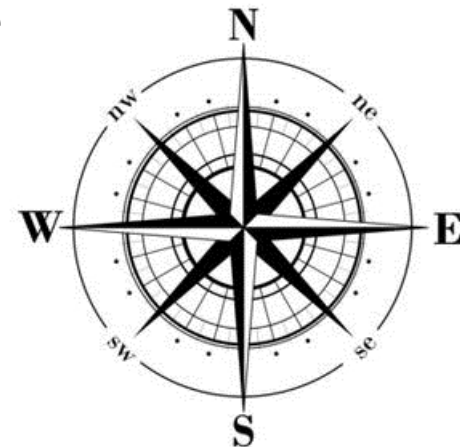



Samarbejdet med klyngerne - de lokale projekter


Fordi klyngerne både er dér hvor løsninger opstår og hvor ar skal ud og fungere i drift som del af sundhedsvæsnets tilbud borgerne/patienterne er det helt centralt for styregruppen i der er fokus på et tæt samarbejde med klyngerne.

Styregruppen vil gerne invitere til en åben drøftelse med klyngestyregruppen hvordan samarbejdet om digitale sundhedsløsninger og telemedicin bedst kan gøres gensidigt virkningsfuldt og inspirerende.

En mødeinvitation følger

En konkrete case

App'en "de Nære Behandlingstilbud" (dagsordenspunkt 8.) er et eksempel på hvordan lokalt udviklede løsninger kan forankres i styregruppen i forbindelse med den videre udviklingsproces, mens udbredelsespotentiallet undersøges.





Styregruppens portefølje

Digitale sundhedsløsninger eller telemedicinske løsninger aftalt i forbindelse med Økonomiaftalerne.

- Telemedicinske sårvurdering (i drift - ny løsning skal implementeres)
- Telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL
- Telemedicin til borgere med hjertesygdom/hjertesvigt (kommende)

Projekter - nationale, fælles i Midtjylland eller lokale projekter i klyngerne

- Nationale projekter fra eksempelvis NSI
- Kompetenceudvikling til digital understøttelse
- App løsninger (Nære Behandlingstilbud)
- Samblik - fælles digital forløbsplan til KOL/diabetes/...
- Andre relevante projekter

TELEMEDICINSK
SÅRVURDERING
KOLLEKTIVT
KONTAKT
KONTAKT






Styregruppens portefølje

Fokus på de kommende projekter med at implementere den nye løsning til telemedicinsk sårvurdering (TeleSår) og telemedicin til borgere med hjertesygdom/hjertesvigt (nyt indsatsområde).

Komme med strategiske indstillinger til drøftelse og beslutning i Sundhedsstyrelsen om bl.a

- Ambitionsniveau ift. sårtyper (inkl. stomi) og anvendelse
- Målgruppe for telemedicin til borgere med hjertesygdom
- Proces, ressourcer og økonomi

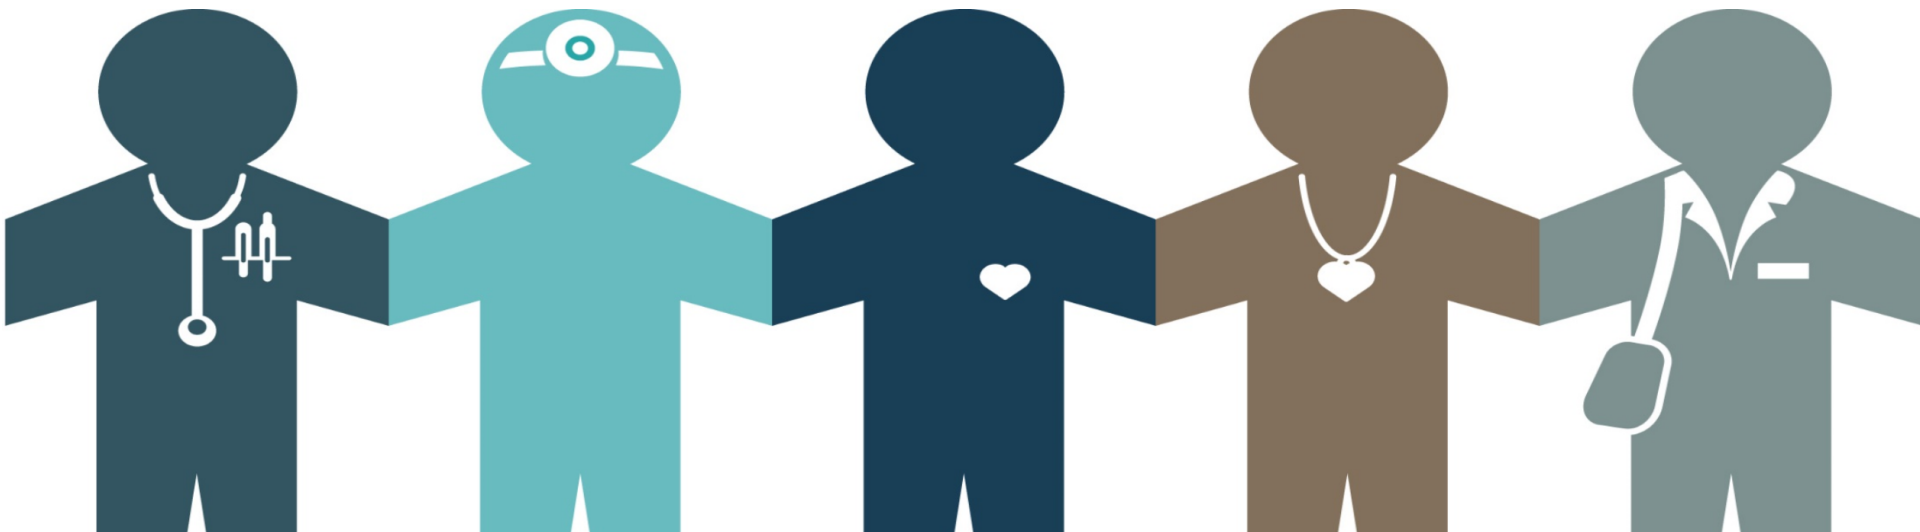




KOL er forsinket, og ...

Fortsat opbakning til det fælles projekt:

- at etablere og udvikle **FUT** er et af de største it-samarbejdsprojekter på tværs af alle landets 98 kommuner og 5 regioner nogensinde
- Den Telemedicinske Infrastruktur ER i drift
- andre løsninger er på vej på Infrastrukturen (Kommunal PRO, Telemedicinsk Sårvurdering, Telemedicin til Hjertesygdom)
- der er etableret indkøbsfællesskaber på tværs af kommuner og regioner i henholdsvis Øst- og Vestdanmark

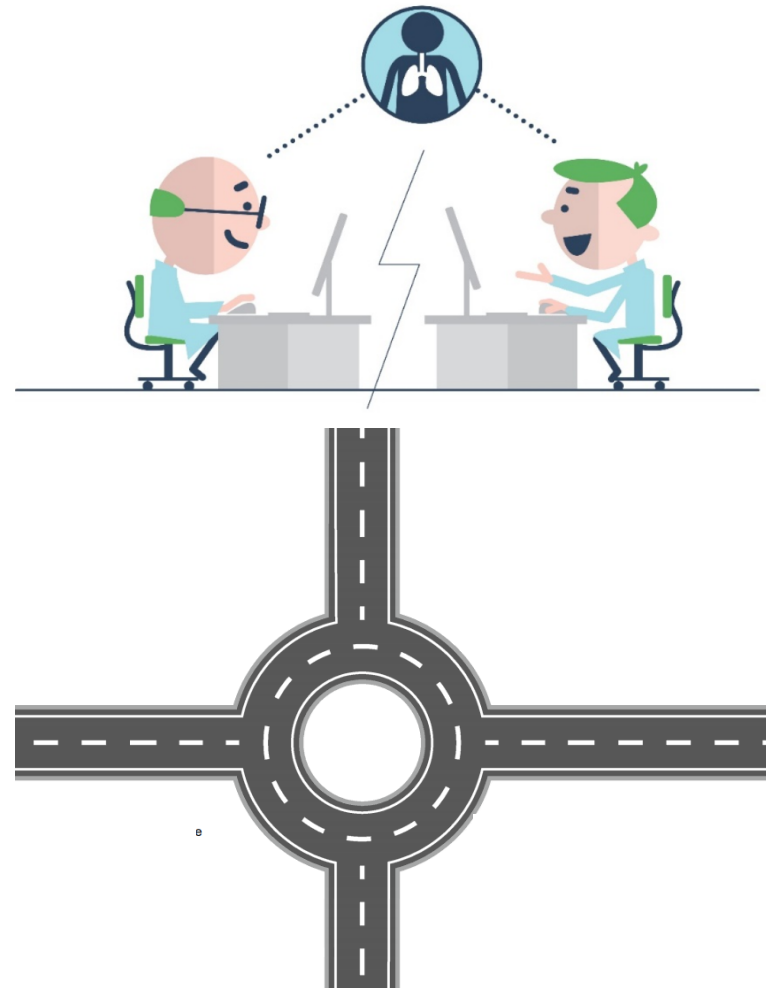


Status på TeleKOL november 2020

Den telemedicinske infrastruktur er i drift - udfordringen er løsningen til borgere og medarbejdere.

Landsdelsprogrammerne har pauseret den videre planlægning af implementering ind til der er sikkerhed for at CGI kan levere løsningen til borgere og medarbejdere i henhold til tidsplanen.

Beslutning om at genoptage planlægning af implementering træffes i Porteføljestyregruppen d. 14. december.

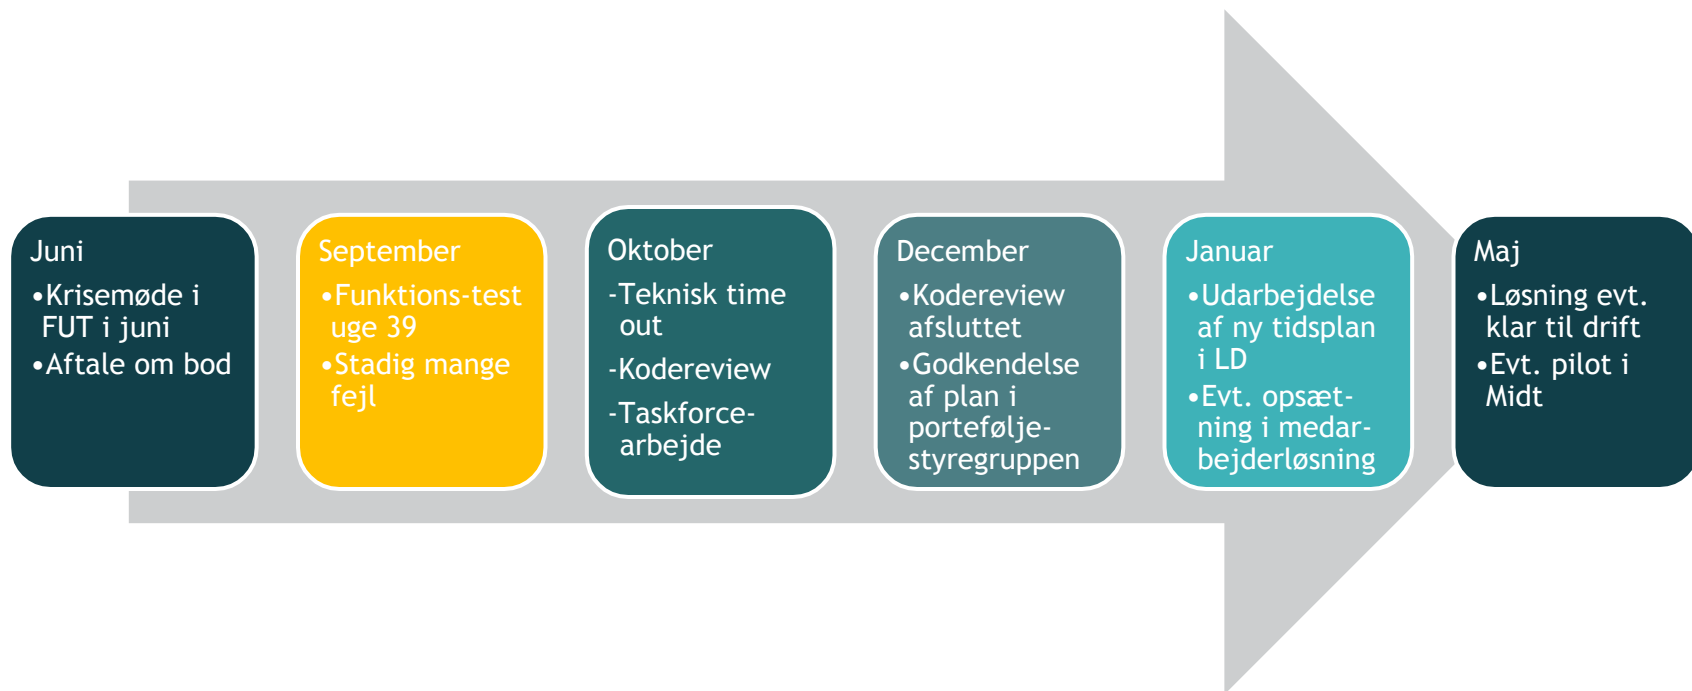

FUT's oplæg til revideret tidsplan og konsekvenser

I Midtjylland er der fokus på kvaliteten af løsningerne. Tidsplanen må ikke være kompromitterende for den kvalitet af løsningerne som borgere og medarbejdere skal teste. Den nye tidsplan for FUT forventes godkendt på møde i den nationale porteføljestyregruppe den 14. december.

Oplæg til tidsplan fra FUT

Nedenstående er de forventede delleverancer af løsningen til borgere og medarbejdere.

- 5.00 godkendes 19. januar (2021)
- Følgende funktioner flyttes fra 5.01 til 5.00: Video 1:1, Tabelvisning og Besked til alle
- 5.01 og 5.02 lægges sammen
- 5.01/5.02 godkendes 19. april (2021)

Konsekvenser i Midtjylland

- Opsætning af spørgeskemaer og planer i administrationsmodul fra uge 1 (2021)
- Planlægning af pilot og implementering udsat til efter Porteføljestyregruppemøde d. 14. december



FUT's oplæg til revideret tidsplan og konsekvenser

Fokus på den økonomiske betydning lokalt for landsdelsprogrammerne. Hvad er de afledte omkostninger af forsinkelserne ikke kun ift. FUT nationalt.

Økonomi i FUT

De hidtidige meromkostninger til FUT som følge af forsinkelser i leverancerne er dækket af den aftalte bod til CGI.

- Forventet yderligere forsinkelse på 3 måneder, inkl. driftsprøve.
- Merudgift til FUT-gennemførselsprojektet estimeres til
- **I alt en merudgift på 2.422.500 kr.**
- FUT-projektets nuværende økonomi kan ikke dække merudgifter

Økonomi i Midtjylland

Der er i merudgiften til FUT ikke taget højde for de afledte udgifter i Midtjylland eller de øvrige landsdele.

- Der kan komme udgifter til fælles indkøbsmyndighed.
- Behov for ændringer i løsninger eller infrastruktur som skal tilkøbes

Status på TeleKOL

Vi arbejder frem mod en god og sikker landing af projektet.....

